

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 15/06/2026 10:44

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0750"	0.00%	RIESGO BAJO
AT-PROV-222	Galvanizada	CAL 14	0.0762"	0.37%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal


Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0750"	+0.000000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-222	0.0762"	+0.001200"	0.37%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

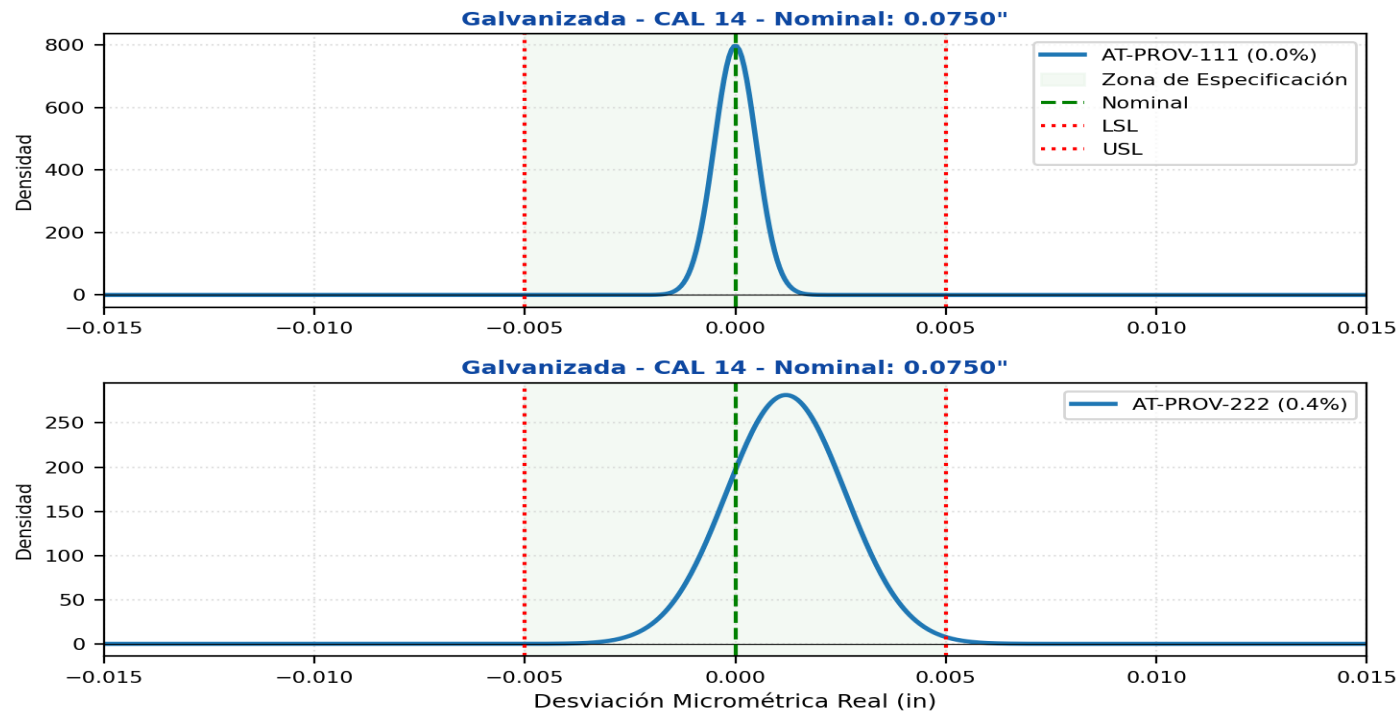

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES
